

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Octubre 2020



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

1. ORDEN DEL DÍA

1. Cambio Presidencia Comisión Sectorial de Descentralización
2. Aprobación Acta N°228
3. Informe del Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)
4. Informe del Programa Caminería Rural (PCR)
5. Presentación de información FIGM
6. Varios



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2020/1066 Construcción de talud y extensión del pavimento de hormigón en puente Urumbeba

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Se construirá protección de talud y extensión del pavimento de hormigón en Puente Urumbeba. Los mismos se extenderán una longitud de 30 m en los accesos (ingresando por Ruta Nº30); cimentación sobre suelo firme de dimensiones 0.50 x 0.50. La protección del talud tiene un espesor de 13 cm el que se une con el pavimento de hormigón de 18 cm de espesor; en los dos casos se utilizará malla electrosoldada. Con esta intervención se evitará el lavado del material ya que con las intensas lluvias se inunda toda la zona generando el socavamiento en el acceso del puente.

Objetivo General: Brindar mayor seguridad vial a los usuarios del paso Urumbeba.

Beneficiarios: Usuarios permanentes y esporádicos que transiten por la zona.

Técnica Responsable GD: María José Fernández

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 588.756	\$ 500.443	\$ 88.313
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Se requiere la presentación de los ensayos correspondientes para las obras de hormigón.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1067 Mantenimiento del espacio público pista skate de la ciudad de Artigas

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: La pista de skate es un lugar de esparcimiento de gran demanda por niños y adolescentes, ubicada en las inmediaciones del paseo 7 de Septiembre y el estadio municipal de la ciudad de Artigas. La zona quedó resentida luego de las medidas de cierre de espacios públicos con motivo de las medidas sanitarias adoptadas por el COVID-19. Con la apertura actual de la misma se requiere realizar reparaciones varias, pintura en general y pintura de mural.

Objetivo General: Reacondicionamiento del espacio público aledaño a la pista de skate ubicada en las cercanías al estadio municipal de la ciudad de Artigas.

Beneficiarios: Usuarios principiantes, deportistas con experiencias y público en general.

Técnica Responsable GD: Cristina Félix

Tipo de proyecto: Mantenimiento

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 1:539.000	\$ 1:308.150	\$ 230.850
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: La certificación será previa presentación de los ensayos correspondientes y las fichas técnicas de los productos usados.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1068 Construcción de drenaje y vialidad en Shangrilá

Departamento: Canelones

Técnicas evaluadoras: Arq. Iris Rozada e Ing. Cecilia Quirós

Descripción: Se trata de una propuesta incluida dentro del marco de las medidas de atención a la emergencia sanitaria frente al COVID-19. El proyecto se encuentra en el marco del proyecto de Infraestructura de saneamiento, drenaje pluvial y vialidad en la denominada zona B3 - subzona perteneciente a la definida Zona B.

Consta de 2 actividades principales: pavimentación de calles con carpeta asfáltica en caliente y construcción de microdrenaje (cunetas, alcantarillas y entradas de los predios).

Estas tareas son realizadas con posterioridad a la intervención por parte de OSE, que incluyen la ejecución de la base en tosca por parte de la empresa contratista de OSE.

Con fecha 21/09/2020 se envió Nota N°480/R/2020 autorizando el inicio anticipado de las actividades del proyecto.

Objetivo General: Pavimentación de calles con carpeta asfáltica en caliente y construcción de microdrenaje.

Beneficiarios: Residentes del barrio Shangrilá.

Técnica Responsable GD: Ing. Laura Morales

Tipo de proyecto: Infraestructuras básicas urbanas

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 43:928.465	\$ 37:339.196	\$ 6:589.270
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Para la primera certificación, se requerirá la presentación del acuerdo entre las partes con el rubrado de los trabajos a realizar firmado por la empresa y la Intendencia.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1069 Mantenimiento vial Rambla Tomás Berreta en Ciudad de la Costa

Departamento: Canelones

Técnicos evaluadores: Arq. Iris Rozada e Ing. Manuel Solari

Descripción: Se trata de una propuesta incluida dentro del marco de las medidas de atención a la emergencia sanitaria frente al COVID-19.

Mantenimiento vial de la calzada norte de la Rambla Tomás Berreta de los barrios Solymar, Lagomar y San José de Carrasco.

Presenta 2 actividades principales:

1) Fresado de 3 cm en carpeta asfáltica existente, recapado, construcción de capa superior asfáltica de 11 cm en 2 tramos, uno de 1640 m y otro de 1110 m.

2) Construcción de un diente de paquete de rodadura en un tramo de 650 m para reacondicionar el borde de calzada.

Con fecha 21/09/2020 se envió Nota N°481/R/2020 autorizando el inicio anticipado de las actividades del proyecto.

Objetivo General: Mantenimiento vial de la calzada norte de la Rambla Tomás Berreta de los barrios Solymar, Lagomar y San José de Carrasco.

Beneficiarios: Residentes de la Rambla Tomás Berreta de los barrios Solymar, Lagomar y San José de Carrasco.

Técnica Responsable GD: Ing. Laura Morales

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 31:177.265	\$ 26:500.675	\$ 4:676.590
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1073 Mantenimiento vial en Municipios y Melo

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Ejecución de riegos bituminosos con sellado y recuperación de bases en diferentes municipios y la capital departamental de Cerro Largo.

Con fecha 21/09/2020 se envió Nota N°483/R/2020 autorizando el inicio anticipado de las actividades del proyecto.

Objetivo General: Intervenir mediante mantenimiento de calles en el departamento de Cerro Largo.

Beneficiarios: Habitantes del departamento de Cerro Largo.

Técnico Responsable GD: Ing. Agrim. Manuel Duarte

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 36:212.208	\$ 30:780.377	\$ 5:431.831
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1072 Mantenimiento de calles en carpeta asfáltica

Departamento: Rivera

Técnicos evaluadores: Ing. Manuel Solari y Arq. Iris Rozada

Descripción: Se trata de una propuesta incluida dentro del marco de las medidas por emergencia sanitaria frente al COVID-19. Mantenimiento de calles: Recapado de 4 cm en carpeta asfáltica en caliente (AC30) en las Av. 1825 (Cuaró) y Pte. Viera. Los trabajos se realizarán en coordinación con OSE. OSE se hará cargo de la sustitución de los caños y la Intendencia de Rivera se hará cargo de la reposición de las veredas.

Objetivo General: Mantenimiento de calles.

Beneficiarios: Habitantes de la ciudad de Rivera.

Técnico Responsable GD: Ing. José Carlos Antúnez

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 13:284.439	\$ 11:291.773	\$ 1:992.666
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Se emplearán 2 licitaciones, LA 43/ 19 mes base octubre 2019 con ajuste paramétrico según ICC para reparación de veredas y LP 01/2019 para carpeta asfáltica con mes base febrero de 2019 con ajuste paramétrico según DNV.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1074 Mantenimiento de calles de Ripio en la ciudad de Salto

Departamento: Salto

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: Proyecto ingresado al amparo de las medidas de flexibilización frente a la emergencia sanitaria. Mantenimiento de calles de tosca.

Objetivo General: Mantenimiento de calles de tosca.

Beneficiarios: Habitantes de la ciudad de Salto.

Técnico Responsable GD: Ing. Juan Pablo Zoppi

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 4:308.798	\$ 3:662.478	\$ 646.320
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1064 Repavimentación de la Rambla de la ciudad de Mercedes

Departamento: Soriano

Técnico evaluador: Ing. Ángel Caldeira

Descripción: Recuperación de la capa de rodadura del pavimento asfáltico en la Rambla de la ciudad Mercedes, entre las calles Cassinoni y J. Suárez la cual es una importante vía con espacio público, deportivo y turístico de la zona. Los trabajos comprenderán un fresado previo de la carpeta asfáltica existente, la ejecución de bacheos, el sellado de juntas y grietas en el pavimento subyacente y la ejecución de una nueva capa de rodadura de 5 cm de espesor usando mezcla asfáltica en caliente. Por tratarse de un proyecto de mantenimiento la intervención se realiza sin consideraciones de cálculo de la estructura del pavimento ni la vida útil estimada.

Objetivo General: Recuperación de la capa de rodadura en el pavimento de la Rambla de Mercedes, mejorándose la circulación del tránsito y la seguridad vial, logrando un sistema de movilidad eficiente y seguro.

Beneficiarios: Habitantes y visitantes de la ciudad de Mercedes.

Técnico Responsable GD: Ing. Pablo Finocchio

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 15:139.371	\$ 12:868.466	\$ 2:270.906
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo al inicio de las certificaciones se deberá realizar el ajuste de precios unitarios y monto de LLSS de acuerdo a lo que surja del contrato correspondiente con la empresa adjudicataria. También se deberá realizar el ajuste del mes base para el cálculo del ajuste paramétrico.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1075 Equipamientos sobre rotonda Wilson Ferreira Aldunate, acondicionamiento puente peatonal sobre cañada Roubin y de veredas en rambla costanera de la ciudad de Mercedes

Departamento: Soriano

Técnico evaluador: Ing. Ángel Caldeira

Descripción: Realización de equipamientos urbanos en la ciudad de Mercedes en tres ejes de acción: construcción de veredas monolíticas de baldosas en un tramo definido y carente de las mismas en la Rambla costanera de Mercedes ubicado entre las calles Tomás Gomensoro y la prolongación de la calle Manuel Herrera y Espinosa que se acompaña de papeleras y rampas de acceso peatonal; el segundo eje de acción es el acondicionamiento sobre la rotonda de la calle Wilson Ferreira Aldunate cruce con av. Luis Alberto de Herrera que es el acceso a la ciudad, donde se colocara una bandera, un muro con leyenda y áreas verdes; se incluye al proyecto el reacondicionamiento del puente de pasaje peatonal ubicado sobre la cañada Roubini Este de la Avda. Luis Alberto de Herrera cerca del cruce con la calle Paysandú.

Objetivo General: Acondicionamiento de equipamientos varios en la ciudad de Mercedes.

Beneficiarios: Habitantes y visitantes de la ciudad de Mercedes.

Técnico Responsable GD: Ing. Pablo Finocchio

Tipo de proyecto: Infraestructuras básicas urbanas

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 1 mes

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 2:066.260	\$ 1:756.321	\$ 309.939
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1070 Mantenimiento vial

Departamento: Tacuarembó

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Escarificado, recarga y conformación de calles para posterior tratamiento bituminoso doble, cordón cuneta y badenes, en varias calles de distintos barrios de la ciudad de Tacuarembó.

Objetivo General: Mejorar las condiciones de tránsito de la ciudad de Tacuarembó.

Beneficiarios: Habitantes de la ciudad de Tacuarembó.

Técnico Responsable GD: Arq. Enzo Vallejos

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 30:704.078	\$ 26:098.466	\$ 4:605.612
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2018/1019 Mejora urbana del barrio San José de la ciudad de Salto

Departamento: Salto

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: Con fecha 22 de julio de 2020 se recibe de la Intendencia de Salto una solicitud de ampliación del proyecto. Habiendo analizado la misma y después de ajustar varios rubros con los técnicos de la Intendencia, se está de acuerdo con la misma y se procede a ingresarla. Dado que el porcentaje de ampliación acumulado a la fecha supera el 20%, es necesaria la intervención de la CSD para su aprobación. El monto total del proyecto pasa de \$ 105.189.398 a \$ 113.326.503.

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 8:137.105	\$ 6:916.539	\$ 1:220.566
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2019/1023 Mantenimiento de calles urbanas de la ciudad de Salto

Departamento: Salto

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: De acuerdo con la solicitud de la Intendencia de Salto, se estudió la posibilidad de ampliar el proyecto en referencia. La misma incluye la construcción de algunas calles del barrio que no habían sido consideradas hasta el momento y que serían las únicas calles sin tratamiento asfáltico del barrio. Habiendo analizado la solicitud y en vista que la misma se encuentra dentro de los pautas del FDI, se envía a la CSD para su aprobación. El monto total del proyecto pasa de \$ 29.553.333 a \$ 34.645.901 necesitando la intervención de la CSD debido a que se supera el 20% del monto inicial del proyecto.

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 5:092.568	\$ 4:328.683	\$ 763.885
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2019/1028 Reconstrucción y acondicionamiento del acceso Este de la ciudad de Mercedes

Departamento: Soriano

Técnico evaluador: Ing. Ángel Caldeira

Descripción: No se realizan objeciones técnicas a la solicitud de la Intendencia de Soriano para ampliación del proyecto. La misma consiste en ampliar las obras por administración en lo referente a equipamiento urbano en el área verde de la zona en los rubros: luminarias con soporte metálico plazoleta, bancos con mesa, bancos con bicicletero, papeleras, bicicleteros, arbolado con colocación y veredas de hormigón; además también se amplían los rubros referentes al contrato de construcción de veredas monolíticas ubicadas en la Av. Luis A. Herrera entre las calles Suárez y Paysandú.

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 5:736.553	\$ 4:876.070	\$ 860.483
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

2.2 Proyectos en evaluación Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Código	Nombre	Fecha ingreso	Técnico/s evaluador/es	Comentario - CSD Octubre 2020
Artigas	FDI2020/1071	Pavimentos de hormigón en Avenida General Artigas, de la ciudad de Bella Unión	19/08/2020	Ing. Guillermo Pepe e Ing. Mario Capote	Se realizó la visita al sitio y está en estudio la documentación del proyecto.
Durazno	FDI2020/1013	Adecuación de barrio Mevir 5 en Cerro Chato	22/05/2020	Ing. Manuel Solari	La Intendencia de Durazno va a presentar la baja del proyecto.
Florida	FDI2020/1028	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de calles en La Cruz y Sarandí Grande	12/06/2020	Ing. María Indarte	En estudio la documentación del proyecto.
Rivera	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	16/04/2020	Ing. Guillermo Pepe e Ing. María Indarte	Proyecto aprobado técnicamente. Actualmente la Intendencia de Rivera no cuenta con disponibilidad de fondos en la cartera del Programa FDI, por lo que la presentación del proyecto a consideración de la CSD se realizará una vez sea ajustada la misma.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Salto	FDI2020/1060	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto	27/07/2020	Ing. Francisco Sorribas	El proyecto está en estudio. El mismo se está evaluando considerando el siguiente contexto: 1) A la fecha del presenta la Intendencia no dispone de fondos libres para asignar a nuevos proyectos; 2) La inversión prevista es de aproximadamente 300 millones de pesos y por tanto la misma será asignada al próximo período de Gobierno, por tal razón se considera importante analizar con la nueva administración si el mismo se encuentra dentro de sus prioridades. Se puede analizar también la posibilidad de ejecutar el proyecto en etapas.
Salto	FDI2020/1065	Emergencia sanitaria - Construcción de núcleo básico nuevas ocupaciones barrio Artigas	07/08/2020	Ing. Manuel Solari	Se ha recibido respuesta parcial de la información solicitada. Se está a la espera de que la Intendencia presente el resto de la información de manera de completar el proceso de verificación.
Soriano	FDI2020/1076	Acondicionamiento de alcantarilla sobre calle José E. Rodó y cañada Roubin de la ciudad de Mercedes	10/09/2020	Ing. Ángel Caldeira	En estudio la documentación del proyecto.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3 8º Certificación 2020 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Certificaciones - Ejecución Agosto/2020			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2017/1049	Construcción de un alojamiento transitorio para pacientes y/o acompañantes del interior del departamento de Artigas	349 589
Artigas - OPP	FDI2019/1020	Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en calle Andrés Cheveste en la ciudad de Artigas	3 293 705
Artigas - OPP	FDI2020/1019	Emergencia sanitaria - Construcción de obras de arte (cordones y veredas) en Artigas	181 953
Canelones - OPP	FDI2017/1004	Infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa (Zona B1 y C1)	21 995 758
Canelones - OPP	FDI2018/1025	Construcción de la infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa (Zona B2)	4 443 399
Cerro Largo - OPP	FDI2019/1040	Construcción y recalificación de conectores viales (Bvar. Cúneo, calles Libertos y Apolinario Pérez) para la ciudad de Melo	2 968 247
Colonia - OPP	FDI2018/1036	Construcción de piscina con vestuarios y obras accesorias en la localidad de Ombúes de Lavalle	795 680
Colonia - OPP	FDI2019/1001	Remodelación Plaza José Enrique Rodó en Juan L. Lacaze	975 326
Durazno - OPP	FDI2019/1013	Rehabilitación parcial de Bvar. Pereira en la ciudad de Sarandí del Yí	3 944 209
Durazno - OPP	FDI2019/1037	Reestructuración de pavimentos en calles de la ciudad de Durazno	577 906
Durazno - OPP	FDI2020/1024	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de espacios públicos de Zorrilla de San Martín, Manuel Oribe y Eusebio Piriz en la ciudad de Durazno	1 629 450
Flores - OPP	FDI2016/1074	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	10 297
Flores - OPP	FDI2019/1036	Mejora del equipamiento urbano de la Av. Inés Durán en el tramo entre Dr. L. Carnelli y Alfredo J. Puig	1 875 154



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Florida - OPP	FDI2017/1031	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	10 297
Florida - OPP	FDI2017/1034	Mejora de la competitividad de la cadena de valor ovina en pequeños y medianos productores en la zona Centro y Este del departamento	105 502
Florida - OPP	FDI2017/1074	Fortalecimiento de los servicios de extensión y gestión de proyectos en el territorio de la Dirección de Desarrollo Sustentable	29 580
Florida - OPP	FDI2018/1017	Consolidación de la organización y profesionalización del sector artesanal y promoción de las Mipymes	79 802
Florida - OPP	FDI2018/1042	Consolidación del barrio Buzón de la localidad de Fray Marcos	1 563 352
Florida - OPP	FDI2019/1009	Mejoras en infraestructura urbana en barrio Portones de la ciudad de Florida	642 488
Florida - OPP	FDI2020/1029	Emergencia sanitaria - Refacción de Plaza de Deportes de Mendoza Grande	374 595
Florida - OPP	FDI2020/1030	Emergencia sanitaria - Refacción de veredas de cementerio Florida	872 434
Florida - OPP	FDI2020/1032	Emergencia sanitaria - Mejoramiento de espacio público Plaza Chamizo	750 854
Lavalleja - OPP	FDI2017/1029	Recuperación de calles urbanas en el departamento de Lavalleja	391 019
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	19 657 248
Maldonado - OPP	FDI2020/1021	Emergencia sanitaria - Pavimentación del barrio MEVIR en la ciudad de Aiguá	1 744 004
Maldonado - OPP	FDI2020/1022	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de barrio Laussana en Municipio de Maldonado	4 837 412
Maldonado - OPP	FDI2020/1045	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de Parques y Espacios Públicos -Jornales solidarios	5 161 862
Paysandú - OPP	FDI2017/1042	Urbanización barrio El Roble de la ciudad de Paysandú	2 956 200
Paysandú - OPP	FDI2018/1046	Acondicionamiento del primer anillo perimetral de la ciudad de Paysandú - Etapa II (Av. Soriano)	4 420 172



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Paysandú - OPP	FDI2020/1011	Mantenimiento vial de la ciudad de Paysandú	3 832 478
Paysandú - OPP	FDI2020/1041	Emergencia sanitaria - Realización de carpeta asfáltica reforzada	10 243 930
Río Negro - OPP	FDI2017/1053	Rehabilitación y ampliación de Casa de la Cultura de la ciudad de Young	472 818
Rivera - OPP	FDI2016/1016	Fortalecimiento de la cadena de producción de sandía	51 000
Rivera - OPP	FDI2018/1037	Acondicionamiento de los accesos este a la ciudad de Rivera	5 617 157
Rivera - OPP	FDI2019/1015	Construcción de pluviales y pavimentos de hormigón en calles Agustín Ortega y Cuenca Joaquín Suárez	4 737 150
Rivera - OPP	FDI2019/1031	Acondicionamiento urbano de barrio Recreo	3 130 387
Rivera - OPP	FDI2020/1040	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de calles en tratamientos asfálticos	2 329 559
Rivera - OPP	FDI2020/1047	Emergencia sanitaria - Mantenimiento del barrio Progreso de la ciudad de Rivera	1 862 742
Rocha - OPP	FDI2017/1058	Acondicionamiento de acceso a Rocha por Avda. Martínez Rodríguez	28 475
Rocha - OPP	FDI2018/1031	Diseño y colocación de cartelería y accesibilidad al medio físico en espacios públicos y turísticos del departamento de Rocha	769 346
Rocha - OPP	FDI2019/1017	Adquisición de maquinaria	2 164 698
Rocha - OPP	FDI2019/1041	Pavimentación de la Avda. Agraciada en la ciudad de Rocha	185 858
Rocha - OPP	FDI2020/1059	Emergencia sanitaria - Proyecto vial y pluvial del barrio Lavalleja de la ciudad de Rocha	395 293
Salto - OPP	FDI2013/1075	Mejora vial y urbana del eje vial Carlos Reyles en la ciudad de Salto	3 937 488
Salto - OPP	FDI2018/1019	Mejora urbana barrio San José de la ciudad de Salto	2 534 841
Salto - OPP	FDI2018/1041	Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter-institucional para el desarrollo local	128 598
Salto - OPP	FDI2018/1043	Fortalecimiento Institucional de las Direcciones de Obra y Hacienda (Compras) de la Intendencia de Salto - Fase II	1 015 012
Salto - OPP	FDI2019/1004	Central Hortícola Salto	2 779 968



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Salto - OPP	FDI2020/1025	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de espacios públicos en el centro de la ciudad de Salto	829 230
Salto - OPP	FDI2020/1026	Emergencia sanitaria - Mantenimiento del Parque Benito Solari de Salto	846 700
Salto - OPP	FDI2020/1039	Emergencia sanitaria - Mantenimiento y pintura de fachada de la Intendencia de Salto y Clínica Municipal	75 142
San José - OPP	FDI2016/1074	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	77 101
San José - OPP	FDI2020/1015	Emergencia sanitaria - Pavimentación de calles en la localidad de Villa María	3 317 767
San José - OPP	FDI2020/1016	Emergencia sanitaria - Construcción de cordón cuneta en la ciudad de San José de Mayo	492 951
Soriano - OPP	FDI2016/1074	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	18 518
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	1 143 929
Soriano - OPP	FDI2020/1063	Compra de cordonera	729 061
Tacuarembó - OPP	FDI2018/1009	Reconstrucción de Avda. Torres Medeiros en la ciudad de Tacuarembó	161 590
Tacuarembó - OPP	FDI2018/1047	MIPESTAC Norte Sur: Incluyendo MYPES del eje de Ruta 5	170 661
Tacuarembó - OPP	FDI2019/1002	Terminal de ómnibus Paso de los Toros	3 470 452
Tacuarembó - OPP	FDI2019/1005	Remodelación de la Avenida Aparicio Saravia en la ciudad de Tacuarembó	4 453 081
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1038	Programa de Desarrollo Empresarial de Treinta y Tres	21 199
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres naturaleza que inspira	133 757
Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1050	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de calle 4 de Octubre de la ciudad de Treinta y Tres	492 739
Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1051	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de la calle Andrés Areguati de la ciudad de Treinta y Tres	514 017



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1052	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de la calle Aurelia Ramos en la ciudad de Treinta y Tres	707 125
Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1053	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial del barrio Artigas de la ciudad de Treinta y Tres	988 773
Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1055	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de la calle Del Sarandí de la ciudad de Treinta y Tres	1 088 906

Fecha cierre
Agosto/2020

Total Certificaciones FDI: \$	152 586 990
--------------------------------------	-------------



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.4 Financiamiento comprometido Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Intendencia	Presupuesto 2020	Financiamiento comprometido 2020	% comprometido 2020	Financiamiento comprometido 2021
Artigas	103 889 502	99 990 416	96%	4 914 741
Canelones	246 423 889	131 584 009	53%	95 586 087
Cerro Largo	121 957 242	118 257 446	97%	25 500 000
Colonia	56 210 746	56 210 746	100%	5 602 378
Durazno	85 487 175	76 321 427	89%	0
Flores	31 618 545	31 434 221	99%	19 013 592
Florida	74 613 073	71 563 592	96%	19 542 290
Lavalleja	78 126 244	73 013 272	93%	32 804 260
Maldonado	49 017 109	47 042 396	96%	24 591 033
Paysandú	104 558 678	94 456 268	90%	43 562 814
Río Negro	60 393 093	57 797 737	96%	33 964 098
Rivera	123 462 887	105 727 478	86%	67 153 671
Rocha	72 605 546	69 885 589	96%	1 500 000
Salto	123 964 767	108 892 328	88%	50 768 746
San José	71 601 783	67 901 126	95%	5 401 696
Soriano	67 252 142	65 530 293	97%	22 100 000
Tacuarembó	128 147 114	104 638 450	82%	41 367 687
Treinta y Tres	73 442 016	72 865 631	99%	21 310 021
Total	1 672 771 551	1 453 112 424	87%	514 683 113

- No se incluyen los montos de los proyectos que se presentan para aprobación en CSD octubre 2020.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Ejecución Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)
Artigas	8 090 471	9 109 139	6 921 262	2 684 291	4 155 632	3 067 063	3 471 350	3 825 247
Canelones	23 038 004	12 095 901	5 014 569	3 258 626	12 348 638	22 980 875	26 208 590	26 439 157
Cerro Largo	0	8 717 952	3 837 189	1 853 476	17 975 826	2 114 954	4 049 592	2 968 247
Colonia	7 202 380	11 596 940	8 536 698	5 477 921	13 560 282	4 440 799	3 624 713	1 771 006
Durazno	8 424 257	1 270 881	5 287 986	3 358 605	6 055 345	3 965 678	10 713 325	6 151 565
Flores	11 500	15 887	9 674	8 022	10 357	10 653	1 639 098	1 885 451
Florida	114 874	5 803 164	6 418 814	1 789 559	4 260 665	10 448 843	12 233 286	4 428 904
Lavalleja	0	2 029 050	2 288 668	1 528 491	3 419 089	3 393 391	6 702 830	20 048 267
Maldonado	4 118 925	0	0	0	0	0	13 737 241	11 743 278
Paysandú	1 772 496	7 670 993	397 070	160 144	0	764 073	5 802 670	21 452 780
Río Negro	4 837 383	1 699 455	1 714 113	696 248	156 377	0	1 393 841	472 818
Rivera	7 826 064	7 833 121	7 086 832	6 307 683	3 825 210	211 801	11 381 504	17 727 995
Rocha	9 292 701	14 664 648	8 564 394	4 896 329	4 552 983	5 712 857	469 542	3 543 670
Salto	1 818 008	16 415 378	4 767 744	2 495 344	4 539 589	6 554 704	16 018 581	12 146 979
San José	12 023 085	996 671	15 550 570	60 064	1 820 133	568 358	3 601 253	3 887 819
Soriano	20 681	11 074 692	2 770 632	1 297 817	2 341 881	19 157	4 158 583	1 891 508
Tacuarembó	9 874 875	10 395 681	6 745 310	4 903 601	5 256 815	6 203 656	8 484 941	8 255 784
Treinta y Tres	280 316	3 541 338	2 439 101	1 160 659	2 091 111	85 537	1 404 958	3 946 516
Total	98 746 020	124 930 891	88 350 626	41 936 880	86 369 933	70 542 399	135 095 898	152 586 991




Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2020	Saldo a ejecutar	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	6.21%	103 889 502	62 565 047	41 324 455	40%
Canelones	14.73%	246 423 889	115 039 529	131 384 360	53%
Cerro Largo	7.29%	121 957 242	80 440 006	41 517 236	34%
Colonia	3.36%	56 210 746	7	56 210 739	100%
Durazno	5.11%	85 487 175	40 259 533	45 227 642	53%
Flores	1.89%	31 618 545	28 027 903	3 590 642	11%
Florida	4.46%	74 613 073	29 114 964	45 498 109	61%
Lavalleja	4.67%	78 126 244	38 716 458	39 409 786	50%
Maldonado	2.93%	49 017 109	19 417 665	29 599 444	60%
Paysandú	6.25%	104 558 678	66 538 452	38 020 226	36%
Río Negro	3.61%	60 393 093	49 422 858	10 970 235	18%
Rivera	7.38%	123 462 887	61 262 677	62 200 210	50%
Rocha	4.34%	72 605 546	20 908 422	51 697 124	71%
Salto	7.41%	123 964 767	59 208 440	64 756 327	52%
San José	4.28%	71 601 783	33 093 830	38 507 953	54%
Soriano	4.02%	67 252 142	43 677 191	23 574 951	35%
Tacuarembó	7.66%	128 147 114	68 026 451	60 120 663	47%
Treinta y Tres	4.39%	73 442 016	58 492 480	14 949 536	20%
Total	100%	1 672 771 551	874 211 913	798 559 638	48%




Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

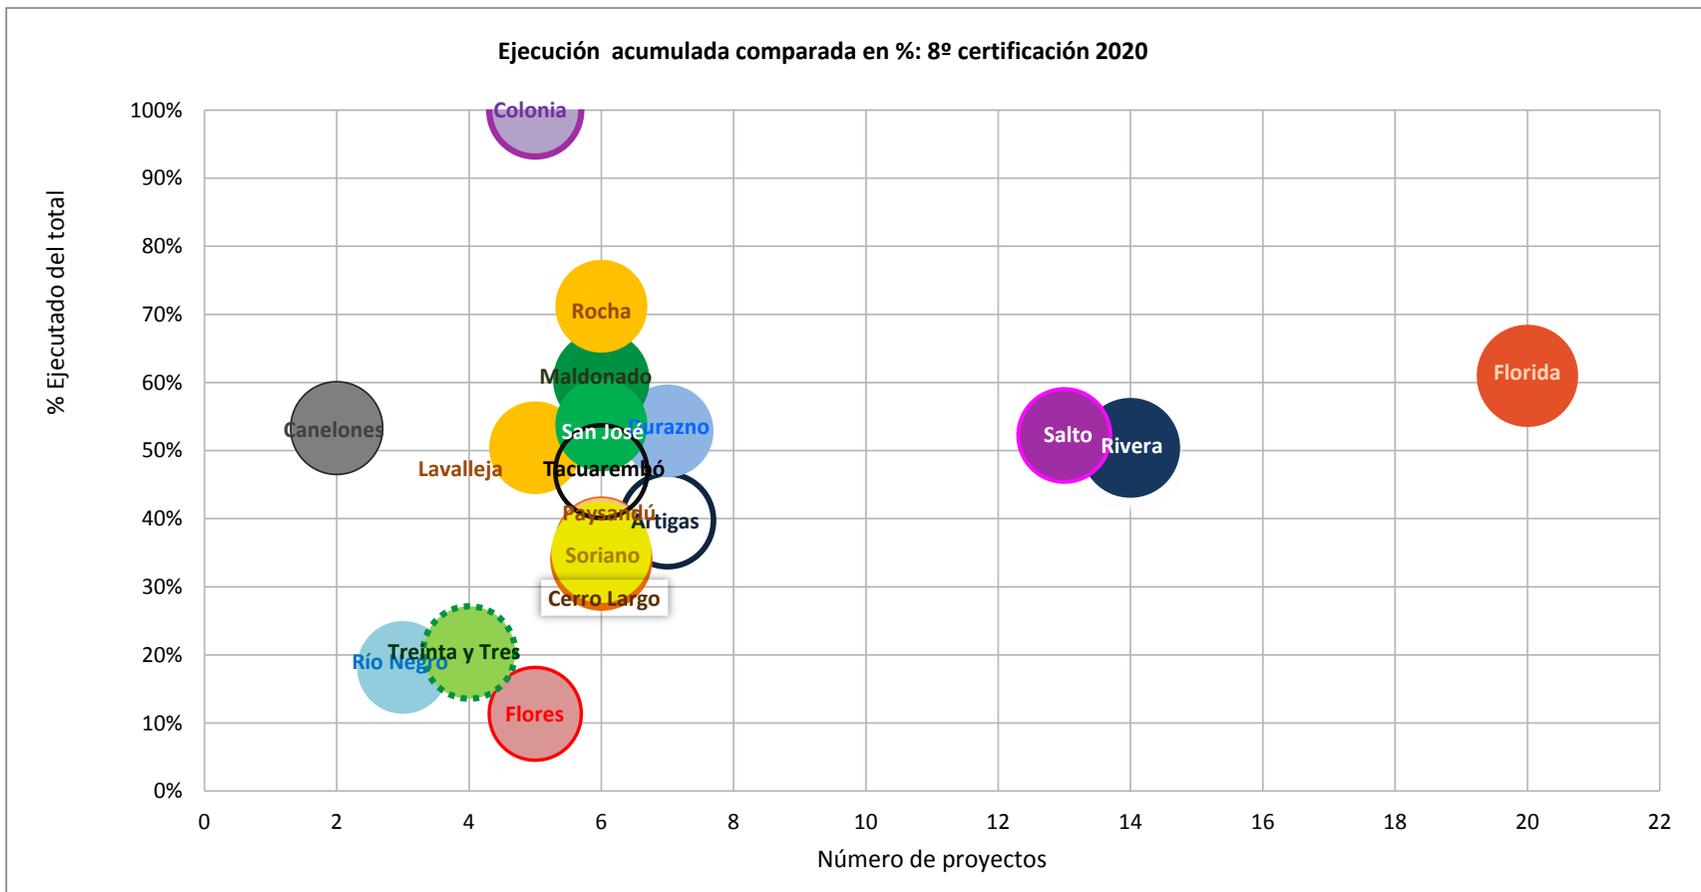



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

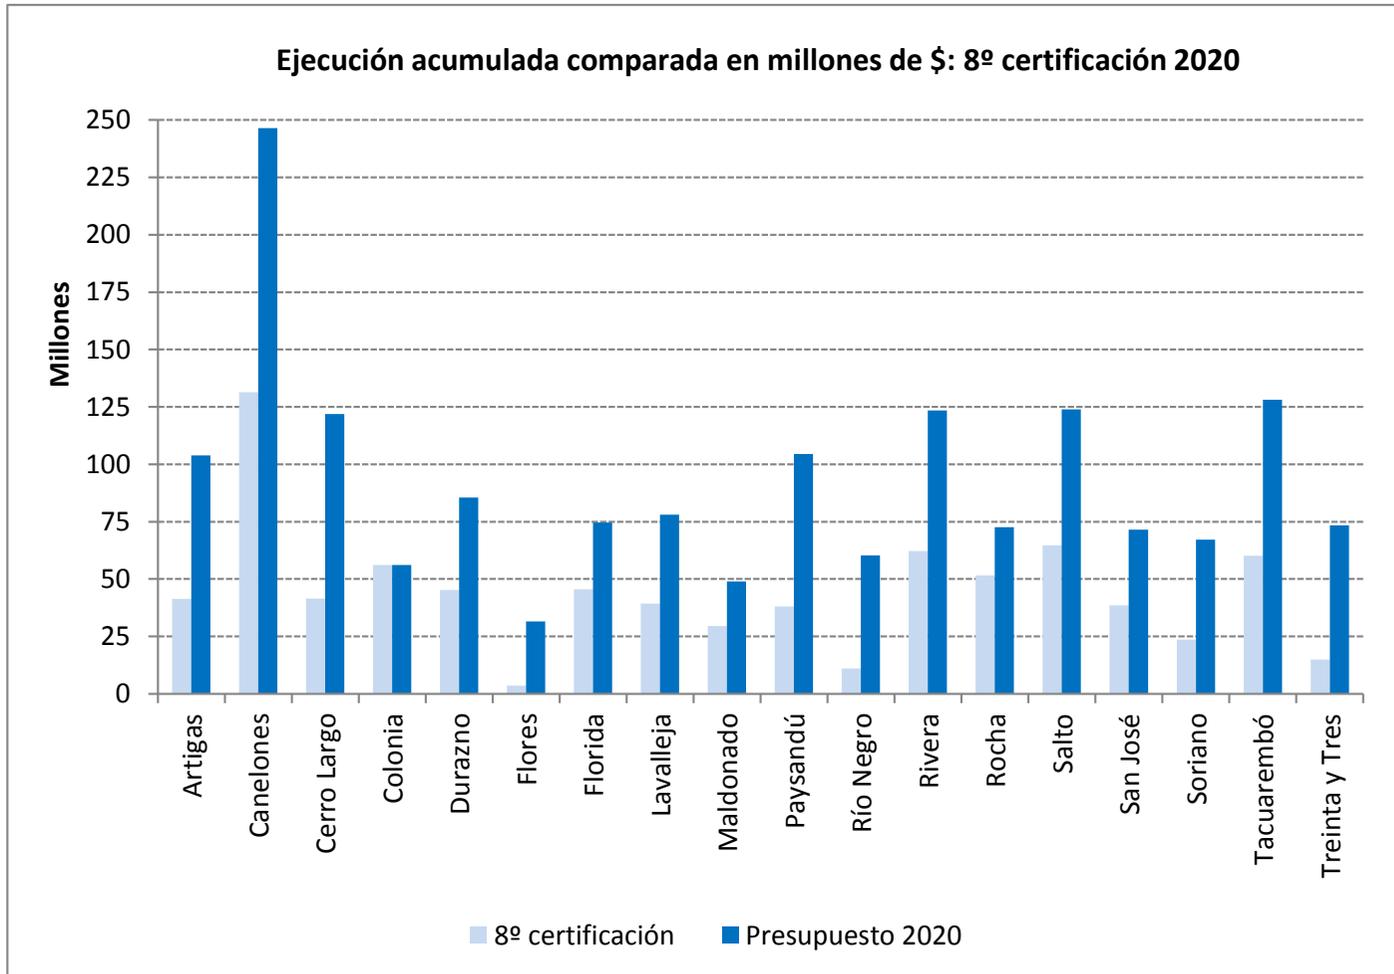



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.6 Pagos Programa Fondo de Desarrollo del Interior

FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR - PRESUPUESTO 2020 - PAGOS									
DEPARTAMENTO	Ejecución 6° Certificación	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Previstos Octubre	SALDO
Artigas	41 324 455	8 090 471	9 109 139	9 605 553	4 155 632	3 067 063	3 471 350	3 825 247	-
Canelones	131 384 360	23 038 004	12 095 901	8 273 195	12 348 638	22 980 875	26 208 590	26 439 157	-
Cerro Largo	41 517 236	-	8 717 952	5 690 665	17 975 826	2 114 954	4 049 592	2 968 247	-
Colonia	56 210 739	7 202 380	11 596 940	14 014 619	13 560 282	4 440 799	3 624 713	1 771 006	-
Durazno	45 227 642	8 424 257	1 270 881	8 646 591	6 055 345	3 965 678	10 713 325	6 151 565	-
Flores	3 590 642	11 500	15 887	17 696	10 357	10 653	1 639 098	1 885 451	-
Florida	45 498 109	114 874	5 803 164	8 208 373	4 260 665	10 448 843	12 233 286	4 428 904	-
Lavalleja	39 409 786	-	2 029 050	3 817 159	3 419 089	3 393 391	6 702 830	20 048 267	-
Maldonado	29 599 444	4 118 925	-	-	-	-	13 737 241	11 743 278	-
Paysandú	38 020 226	1 772 496	7 670 993	557 214	-	764 073	5 802 670	21 452 780	-
Río Negro	10 970 235	4 837 383	1 699 455	2 410 361	156 377	-	1 393 841	472 818	-
Rivera	62 200 210	7 826 064	7 833 121	13 394 515	3 825 210	211 801	11 381 504	17 727 995	-
Rocha	51 697 124	9 292 701	14 664 648	13 460 723	4 552 983	5 712 857	469 542	3 543 670	-
Salto	64 756 327	1 818 008	16 415 378	7 263 088	4 539 589	6 554 704	16 018 581	12 146 979	-
San José	38 507 953	12 023 085	996 671	15 610 634	1 820 133	568 358	3 601 253	3 887 819	-
Soriano	23 574 951	20 681	11 074 692	4 068 449	2 341 881	19 157	4 158 583	1 891 508	-
Tacuarembó	60 120 663	9 874 875	10 395 681	11 648 911	5 256 815	6 203 656	8 484 941	8 255 784	-
Treinta y Tres	14 949 536	280 316	3 541 338	3 599 760	2 091 111	85 537	1 404 958	3 946 516	-
Total	798 559 638	98 746 020	124 930 891	130 287 506	86 369 933	70 542 399	135 095 898	152 586 991	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROGRAMA CAMINERÍA RURAL

3.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2020/1008 Adecuación de pluviales, construcción de alcantarillas y mantenimiento extraordinario de los Tramos 260 y 360

Departamento: Colonia

Técnica evaluadora: María Noel de la Vega

Descripción: Los tramos considerados son conexiones importantes entre localidades y rutas. En el caso del tramo 260 desde Colonia Valdense (Ruta N°1) a la Ruta N°1 “nueva” (el trazado en un sólo sentido hacia Colonia). El tramo 364 desde Nueva Helvecia (en su salida norte por Ruta N°53) hacia la Ruta N°52 (a Cufre).

Objetivo General: Mejorar la transitabilidad, el escurrimiento de pluviales y la seguridad vial.

Beneficiarios: 1000 personas.

Técnico Responsable GD: Ing. Civil Gonzalo Santos, Ing. Civil Héctor Anzalas, Ing. Agrim. Gustavo Curutchet

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCRP	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 7:516.478	\$ 5:261.535	\$ 2:254.943
Porcentaje	100%	70%	30%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: PCR2020/1006 Rehabilitación de puentes en el camino a las Sierras de Rocha

Departamento: Rocha

Técnica evaluadora: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Construcción de cuatro alcantarillas tipo H de hormigón armado de 4 bocas de 2.0 x 2.0 mts y una alcantarilla de 1,20 x 1,60 mts previa demolición de los puentes de madera existentes, los cuales se encuentran en mal estado constituyendo un peligro potencial para la circulación de vehículos pesados.

Objetivo General: Aportar mayor seguridad y vida útil a los pasos por el camino UYRO0037, el cual cuenta con circulación de vehículos pesados lo cual puede representar un peligro potencial ya que actualmente existen puentes de madera.

Beneficiarios: Existen 47 familias radicadas en la zona que integran varias comunidades de gente joven, los cuales viajan diariamente a la ciudad de Rocha por motivos laborales, educativos, de salud, financieros, abastecimiento, etc. La producción forestal y el turismo también se pueden considerar como beneficiarios directos para este proyecto.

Técnico Responsable GD: Ing. Juan José Pertusso

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 9 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Febrero 2021

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 18:891.166	\$ 13:223.816	\$ 5:667.350
Porcentaje	100%	70%	30%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: PCR2019/1020 Repavimentación de tramo de Ruta Nº19 al oeste de la ciudad de Treinta y Tres

Departamento: Treinta y Tres

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Repavimentación de tramo de Ruta 19. El tramo a intervenir es de 6 km aproximadamente y un ancho de 6.50 m. Las tareas involucradas incluyen: conformación de sección transversal a perfil rural tipo, recargo de material granular CBR 80% con espesor de 20 cm, ejecución de tratamiento bituminoso doble con sellado y mejoras en la planimetría en dos curvas de dicho tramo. Además se van a ejecutar obras hidráulicas tipo alcantarillas y sus respectivos cabezales de hormigón. Finalmente se colocará la señalización vertical y pintura horizontal en eje.

Objetivo General: Aumentar la seguridad y el confort de los usuarios del tramo a intervenir y aumentar la vida útil, y calidad del pavimento en ese tramo.

Beneficiarios: Habitantes involucrados en el área del proyecto, especialmente los productores, transportistas, empresas de servicios agropecuarios, cerealero y eventualmente forestal. La cantidad de habitantes que comprende el proyecto es mínima en relación a la cantidad de tránsito diario.

Técnico Responsable GD: Ing. Agrim. César Vesperoni

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCRP	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 25:351.553	\$ 17:746.087	\$ 7:605.466
Porcentaje	100%	70%	30%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Proyectos en evaluación Programa Caminería Rural

Departamento	Código	Nombre	Fecha ingreso	Técnico/s evaluador/es	Comentario - CSD Octubre 2020
Artigas	PCR2018/1007	Reconstrucción alcantarilla rural Ceballos (UYAR0091)	21/06/2018	Ing. Ricardo Gamboa	El proyecto está aprobado técnicamente. Se está a la espera de la definición de la Intendencia, en relación a la cartera de proyectos, para su aprobación formal.
Canelones	PCR2020/1007	Pavimentación del camino el Gigante entre la vía férrea y camino Folle	19/08/2020	Ing. María Indarte	Se encuentra en estudio la documentación del proyecto.
Canelones	PCR2020/1009	Colocación de estructuras prefabricadas de hormigón en camino UYCA 1096	10/09/2020	Ing. Guillermo Pepe y Arq. Carolina Ghio	Se realizó el estudio de la documentación recibida y visita al lugar. Se está a la espera de una decisión formal por parte de la Intendencia sobre su fuente de financiamiento.
Canelones	PCR2020/1010	Colocación de estructuras prefabricadas de hormigón en camino UYCA 0037	10/09/2020	Ing. Guillermo Pepe y Arq. Carolina Ghio	Se realizó el estudio de la documentación recibida y las verificaciones correspondientes. Se realiza la visita al lugar. A la espera de una definición por parte de la Intendencia de Canelones ya que la obra hidráulica presentada (estructuras prefabricadas) forma parte del proyecto aprobado en septiembre de 2019 PCR2019/1002 Pavimentación en camino Eduardo Pérez.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cerro Largo	PCR2019/1022	Pavimentación del acceso a Arévalo con tratamiento bituminoso	23/10/2019	Ing. Cecilia Quirós e Ing. Francisco Sorribas	A la fecha del presente el proyecto continúa con algunos ajustes pendientes. Por otra parte, dada la magnitud de la inversión (aprox. 150 millones de pesos), se considera importante analizar con la nueva administración si el mismo se encuentra dentro de sus prioridades.
Florida	PCR2020/1005	Pavimentación en Ex Ruta N°58 (UYFD0152)	09/07/2020	Ing. Manuel Solari	Proyecto sin actividad. El 14 de agosto del corriente se envió Nota de devolución de la evaluación del proyecto con comentarios al mismo. Se está a la espera de la respuesta por parte de la Intendencia.
Montevideo	PCR2020/1003	Ensanche y refuerzo del puente sobre el Arroyo Pantanoso en la Avda. Luis Batlle Berres	12/06/2020	Ing. Mario Capote	Se abrirá la licitación del anteproyecto el 14 de octubre 2020, luego de eso se realizará el proyecto y se ajustará para aprobación técnica
Montevideo	PCR2020/1004	Rehabilitación del pavimento de la Avda. Luis Batlle Berres entre camino Méndez y camino Basilio Muñoz	07/07/2020	Ing. Ricardo Gamboa	A la espera de que la Intendencia presente la información solicitada en la Nota N°371/R/2020, enviada el pasado 30/07/2020.
Rivera	PCR2020/1012	Construcción de alcantarilla tipo H y Z en la localidad de Tres Cerros	05/10/2020	Ing. Guillermo Pepe e Ing. Manuel Solari	En estudio la documentación del proyecto.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.3 8º Certificación 2020

Programa Camineria Rural - BID

Certificaciones - Ejecución Agosto/2020			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Durazno - OPP	PCR2018/1029	Asfaltado en camino Los Paraguayos	554 755
Maldonado - OPP	PCR2019/1007	Pavimentación del camino Paso de la Cantera	4 854 059
Río Negro - OPP	PCR2018/1013	Reacondicionamiento del tramo Menafra - Paso de la Cruz	493 673
Rivera - OPP	PCR2019/1005	Pavimentación del camino Amarillo - Lapuente	3 638 762
Rocha - OPP	PCR2019/1021	Construcción de tablero, protecciones laterales y accesos en puente Paso del Álamo	1 787 202
Salto - OPP	PCR2018/1035	Acceso a San Antonio	4 830 816
San José - OPP	PCR2018/1021	Tramo 114 camino Rincón de la Torre	3 068 133
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1010	Construcción de baden sumergible en Paraje Paso de los Novillos (UYTA0309)	1 145 887
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1013	Pavimentación del camino a La Virgencita	1 272 283
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By Pass Oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales 31 y 26 (UYTA0149 - UYTA0151)	3 384 514

Fecha cierre
Agosto/2020

Total Certificaciones PCR: \$	25 030 085
--------------------------------------	------------



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Programa Caminería Rural - RRGG

Certificaciones - Ejecución Agosto/2020			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2018/1017	Pavimentación del circuito del tránsito pesado en el sector Sur de la ciudad de Canelones (Camino Passadore-Dorbal Silveira)	151 815
Canelones - OPP	PCR2019/1004	Pavimentación de la conectividad cortada Marino entre las Rutas N°6 y N°7	807 222

Fecha cierre
Agosto/2020

Total Certificaciones PCR: \$	959 037
--------------------------------------	---------



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

3.4 Ejecución Programa Caminos Rurales Productivos (PCRP)

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)
Artigas	0	0	0	0	0	0	0	0
Canelones	0	45 697 292	2 720 957	1 635 705	1 480 007	2 415 332	1 768 041	0
Cerro Largo	0	0	0	0	0	0	0	0
Colonia	10 981 703	3 734 449	3 057 543	9 180 729	6 505 672	2 621 255	2 813 778	0
Durazno	4 422 289	4 534 463	7 102 092	5 249 777	6 229 956	6 152 880	4 601 359	554 755
Flores	0	0	0	0	0	0	0	0
Florida	1 813 530	1 698 523	22 813 615	6 930 169	2 547 041	1 099 630	0	0
Lavalleja	0	0	0	0	0	0	0	0
Maldonado	0	0	0	0	0	0	0	4 854 059
Montevideo	0	0	0	0	0	0	0	0
Paysandú	0	4 568 754	1 197 564	241 975	0	0	0	0
Río Negro	9 072 630	1 839 054	4 947 765	5 755 578	1 610 281	3 441 431	201 111	493 673
Rivera	0	0	0	1 417 768	1 243 591	1 783 860	7 281 661	3 638 762
Rocha	2 517 276	290 560	0	1 333 002	0	0	0	1 787 202
Salto	0	533 363	3 332 966	1 959 663	3 435 208	511 984	21 861 813	4 830 816
San José	1 940 303	1 357 815	5 361 635	3 314 855	3 938 666	12 034 462	2 746 983	3 068 133
Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0
Tacuarembó	0	0	5 106 738	2 699 672	4 523 803	4 828 367	8 644 167	5 802 684
Treinta y Tres	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	30 747 731	64 254 273	55 640 875	39 718 893	31 514 225	34 889 201	49 918 913	25 030 084



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2020 (*)	Saldo a ejecutar	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	5.55%	23 728 063	23 728 063	0	0%
Canelones	11.70%	50 022 916	-5 694 418	55 717 334	111%
Cerro Largo	6.49%	27 728 537	27 728 537	0	0%
Colonia	5.39%	23 056 376	-15 838 753	38 895 129	169%
Durazno	5.38%	23 014 345	-15 833 226	38 847 571	169%
Flores	2.88%	12 326 552	12 326 552	0	0%
Florida	4.66%	19 923 853	-16 978 655	36 902 508	185%
Lavalleja	5.40%	23 094 897	23 094 897	0	0%
Maldonado	4.03%	17 238 492	12 384 433	4 854 059	28%
Montevideo	3.21%	13 741 913	13 741 913	0	0%
Paysandú	6.06%	25 897 209	19 888 916	6 008 293	23%
Río Negro	4.00%	17 103 538	-10 257 985	27 361 523	160%
Rivera	4.48%	19 151 563	3 785 921	15 365 642	80%
Rocha	4.52%	19 313 477	13 385 437	5 928 040	31%
Salto	6.16%	26 316 695	-10 149 118	36 465 813	139%
San José	4.40%	18 827 782	-14 935 070	33 762 852	179%
Soriano	4.51%	19 267 230	19 267 230	0	0%
Tacuarembó	7.13%	30 495 110	-1 110 321	31 605 431	104%
Treinta y Tres	4.04%	17 251 455	17 251 455	0	0%
Total	100.00%	427 500 000	95 785 805	331 714 195	78%

(*) Montos de referencia. Presupuesto quinquenal.

3.5 Ejecución Programa Caminería Rural (RRGG)



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)
Artigas	0	0	0	0	0	0	78 750	0
Canelones	0	0	0	0	0	0	0	959 037
Cerro Largo	0	0	0	0	0	0	0	0
Colonia	0	0	0	0	0	0	0	0
Durazno	0	0	0	0	2 510 355	0	0	0
Flores	0	0	0	0	0	0	0	0
Florida	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavalleja	0	0	0	0	0	0	0	0
Maldonado	0	0	0	0	0	0	0	0
Montevideo	0	0	0	0	0	0	0	0
Paysandú	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	34 160	0	6 832	0	0	0	148 652	0
Rivera	0	0	0	0	0	0	0	0
Rocha	0	0	0	0	0	0	0	0
Salto	0	0	0	0	0	0	0	0
San José	0	0	0	0	0	0	0	0
Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0
Tacuarembó	0	0	0	0	0	0	930 829	0
Treinta y Tres	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	34 160	0	6 832	0	2 510 355	0	1 158 231	959 037



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2020	Saldo a ejecutar	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	5.55%	6 145 619	6 066 869	78 750	1%
Canelones	11.70%	12 956 043	11 997 006	959 037	7%
Cerro Largo	6.49%	7 181 751	7 181 751	0	0%
Colonia	5.39%	5 971 651	5 971 651	0	0%
Durazno	5.38%	5 960 765	3 450 410	2 510 355	42%
Flores	2.88%	3 192 604	3 192 604	0	0%
Florida	4.66%	5 160 321	5 160 321	0	0%
Lavalleja	5.40%	5 981 628	5 981 628	0	0%
Maldonado	4.03%	4 464 807	4 464 807	0	0%
Montevideo	3.21%	3 559 185	3 559 185	0	0%
Paysandú	6.06%	6 707 433	6 707 433	0	0%
Río Negro	4.00%	4 429 853	4 240 209	189 644	4%
Rivera	4.48%	4 960 296	4 960 296	0	0%
Rocha	4.52%	5 002 232	5 002 232	0	0%
Salto	6.16%	6 816 081	6 816 081	0	0%
San José	4.40%	4 876 436	4 876 436	0	0%
Soriano	4.51%	4 990 254	4 990 254	0	0%
Tacuarembó	7.13%	7 898 299	6 967 470	930 829	12%
Treinta y Tres	4.04%	4 468 164	4 468 164	0	0%
Total	100.00%	110 723 424	106 054 809	4 668 615	4%

(*) Monto de referencia. Presupuesto quinquenal.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.6 Situación proyectos Planes Viales Departamentales

DEPARTAMENTO	Cantidad de Proyectos 2018-2022				
	Previstos en Plan	Presentados ante OPP	Aprobados CSD (licitación sin adjudicar)	En ejecución (licitación adjudicada)	Finalizados
Artigas	4	1	1		
Canelones	7	1	3	2	1
Cerro Largo	6	1	3		
Colonia	6		1	2	
Durazno	3			2	
Flores	4		1		
Florida	5			2	1
Lavalleja	4	1			1
Maldonado	6		1	2	1
Montevideo	3	2			1
Paysandú	6		1	1	
Río Negro	2			1	
Rivera	4			1	
Rocha	11	1		2	2
Salto	6	1	1	1	
San José	4		1	1	
Soriano	5		1		
Tacuarembó	8			3	2
Treinta y Tres	2	1		1	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.7 Pagos

CAMINERIA RURAL - PROYECTOS 994 PRESUPUESTO 2020 - PAGOS									
DEPARTAMENTO	Acumulado 8º Certificación	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre/ 1eros días Octubre	Pagos Previstos Octubre	Saldo
Artigas	78 750	-	-	-			78 750	-	-
Canelones	56 676 371	-	45 697 292	2 720 957	1 635 705	1 480 007	4 183 373	959 037	-
Cerro Largo	-	-	-	-			-	-	-
Colonia	38 895 129	10 981 703	3 734 449	3 057 543	9 180 729	2 499 663	7 621 536	1 819 506	-
Durazno	41 357 926	4 422 289	4 534 463	7 102 092	5 249 777	8 740 311	10 754 239	554 755	-
Flores	-	-	-	-			-	-	-
Florida	36 902 508	-	3 512 053	19 854 019	4 636 880	7 799 926	1 099 630	-	-
Lavalleja	-	-	-	-			-	-	-
Maldonado	4 854 059	-	-	-			-	4 854 059	-
Montevideo	-	-	-	-			-	-	-
Paysandú	6 008 293	-	4 568 754	1 197 564	241 975		-	-	-
Río Negro	27 545 939	9 106 791	1 833 825	6 832	5 755 578	6 558 045	3 590 083	694 785	-
Rivera	15 365 642	-	-	-	1 417 769	1 243 590	9 065 521	3 638 762	-
Rocha	5 890 960	2 517 276	290 560	-	1 333 002		-	1 750 122	-
Salto	36 465 813	-	444 177		4 796 537	3 435 209	22 373 796	5 416 094	-
San José	33 762 852	1 940 303	1 357 815	5 361 635	3 314 856	3 938 666	14 781 444	3 068 133	-
Soriano	-	-	-	-			-	-	-
Tacuarembó	32 536 260	-	-	5 106 738	2 699 672	4 523 804	14 403 362	5 802 684	-
Treinta y Tres	-	-	-	-			-	-	-
Total	336 340 502	28 968 362	65 973 388	44 407 380	40 262 480	40 219 221	87 951 734	28 557 937	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4. PROYECTOS 998 Y 999 (Mantenimiento)

4.1 Tramos para aprobar

Intendencia de Colonia

DEPARTAMENTO	Colonia	RESPONSABLE	Ing. Héctor Anzalas
AÑO	2020		

Código	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYCO0153	Camino Paso Monzón	6.9	5.5	Mant. Extraordinario parcial y O. de A.
UYCO0668	Camino Paso Quebracho	10.9	5.5	Mant. Extraordinario parcial y O. de A.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4.2 Ejecución Proyecto 998

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)
Artigas	0	0	0	0	0	0	0	0
Canelones	0	0	0	0	0	2 079 934	8 261 997	2 648 166
Cerro Largo	0	0	0	0	0	0	0	0
Colonia	0	69 197	236 008	1 970 983	4 004 170	0	0	0
Durazno	0	0	0	0	0	0	0	0
Flores	0	0	0	0	0	0	2 595 644	0
Florida	0	0	0	0	0	0	0	1 764 029
Lavalleja	0	0	0	0	0	0	0	0
Maldonado	0	0	0	0	0	0	0	0
Montevideo	0	0	0	0	0	0	0	0
Paysandú	0	0	0	0	0	0	11 180 915	0
Río Negro	0	0	0	3 453 903	9 404 108	986 750	1 138 097	0
Rivera	0	0	0	0	739 048	4 958 713	2 486 111	3 107 165
Rocha	0	0	0	0	0	0	2 101 383	2 140 388
Salto	0	0	0	0	0	0	0	1 376 422
San José	0	0	0	0	1 863 181	2 187 624	1 195 573	157 434
Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0
Tacuarembó	0	0	0	0	0	0	0	0
Treinta y Tres	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	69 197	236 008	5 424 886	16 010 507	10 213 020	28 959 719	11 193 604



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2020	Saldo	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	3%	5 034 778	5 034 778	0	0%
Canelones	8%	15 290 237	2 300 140	12 990 097	85%
Cerro Largo	7%	14 212 951	14 212 951	0	0%
Colonia	3%	6 811 674	531 315	6 280 359	92%
Durazno	6%	11 358 930	11 358 930	0	0%
Flores	1%	2 815 234	219 590	2 595 644	92%
Florida	6%	12 671 043	10 907 014	1 764 029	14%
Lavalleja	9%	17 331 220	17 331 220	0	0%
Maldonado	4%	8 662 645	8 662 645	0	0%
Montevideo	1%	1 440 332	1 440 332	0	0%
Paysandú	8%	16 143 153	4 962 239	11 180 915	69%
Río Negro	8%	16 250 401	1 267 543	14 982 858	92%
Rivera	11%	22 295 720	11 004 683	11 291 037	51%
Rocha	5%	9 231 752	4 989 981	4 241 771	46%
Salto	4%	8 594 011	7 217 590	1 376 422	16%
San José	3%	6 116 287	712 476	5 403 811	88%
Soriano	4%	7 036 748	7 036 748	0	0%
Tacuarembó	6%	12 890 687	12 890 687	0	0%
Treinta y Tres	3%	6 584 968	6 584 968	0	0%
Total	100%	200 772 771	128 665 828	72 106 942	36%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4.3 Ejecución Proyecto 999

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)
Artigas	0	1 501 759	3 125 918	2 648 889	882 802	2 687 913	4 951 858	0
Canelones	3 593 626	6 506 278	13 520 209	479 045	8 868 597	17 657 025	0	0
Cerro Largo	1 499 434	848 028	4 318 538	1 883 045	4 151 752	2 796 645	2 211 862	3 177 288
Colonia	7 205 554	16 128 231	0	0	0	0	0	0
Durazno	0	3 483 390	1 013 220	3 932 978	4 256 367	5 464 581	0	905 448
Flores	0	4 021 362	4 336 984	2 563 145	0	0	1 553 372	0
Florida	0	3 227 841	2 622 799	6 920 879	1 304 265	2 989 496	2 114 660	983 632
Lavalleja	0	5 322 655	742 032	3 233 549	1 259 219	1 843 569	3 185 119	4 444 728
Maldonado	2 505 317	0	0	0	0	0	0	1 325 640
Montevideo	0	201 031	568 066	59 616	0	38 798	279 404	8 652 478
Paysandú	1 548 291	0	2 229 144	1 767 240	7 192 017	8 166 834	5 305 271	0
Río Negro	2 434 266	5 887 188	8 678 178	309 692	0	0	0	0
Rivera	8 367 671	2 040 893	3 931 417	4 973 875	68 134	0	0	0
Rocha	1 985 224	3 379 187	5 444 292	0	2 841 869	1 158 195	4 737 086	0
Salto	0	0	0	0	5 934 316	0	12 234 344	8 464 672
San José	5 125 393	4 038 430	2 000 412	2 278 823	5 611 255	0	0	0
Soriano	5 333 242	1 507 768	1 142 235	0	1 196 388	1 893 662	3 513 782	4 253 092
Tacuarembó	4 121 134	2 602 821	3 501 350	2 372 749	5 034 453	3 847 153	3 596 532	4 407 453
Treinta y Tres	1 992 769	1 730 687	1 185 076	288 420	975 963	525 005	2 077 597	2 024 067
Total	45 711 921	62 427 549	58 359 871	33 711 943	49 577 396	49 068 875	45 760 886	38 638 499



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2020	Saldo	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	6%	26 113 095	10 313 957	15 799 138	61%
Canelones	12%	55 050 981	4 426 201	50 624 780	92%
Cerro Largo	6%	30 515 677	9 629 086	20 886 592	68%
Colonia	5%	25 373 893	2 040 108	23 333 785	92%
Durazno	5%	25 327 638	6 271 654	19 055 984	75%
Flores	3%	13 565 559	1 090 696	12 474 862	92%
Florida	5%	21 926 503	1 762 932	20 163 572	92%
Lavalleja	5%	25 416 286	5 385 413	20 030 873	79%
Maldonado	4%	18 971 223	15 140 266	3 830 956	20%
Montevideo	3%	15 123 185	5 323 792	9 799 393	65%
Paysandú	6%	28 500 273	2 291 475	26 208 798	92%
Río Negro	4%	18 822 705	1 513 380	17 309 324	92%
Rivera	4%	21 076 587	1 694 597	19 381 990	92%
Rocha	5%	21 254 775	1 708 923	19 545 852	92%
Salto	6%	28 961 924	2 328 593	26 633 331	92%
San José	4%	20 720 261	1 665 947	19 054 313	92%
Soriano	5%	21 203 880	2 363 711	18 840 169	89%
Tacuarembó	7%	33 560 334	4 076 690	29 483 644	88%
Treinta y Tres	4%	18 985 489	8 185 907	10 799 582	57%
Total	100%	470 470 268	87 213 328	383 256 940	81%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4.4 Pagos Proyecto 998

MANTENIMIENTO CAMINERIA - PROYECTOS 998 PRESUPUESTO 2020 - PAGOS								
DEPARTAMENTO	Acumulado hasta 8° Certificación	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos previstos Octubre	Saldo
Artigas	-			-	-	-	-	-
Canelones	12 990 097			-	2 079 934	8 261 997	2 648 166	0
Cerro Largo	-			-	-	-	-	-
Colonia	6 280 359	69 197	236 008	1 970 983	4 004 171	-	-	-
Durazno	-			-	-	-	-	-
Flores	2 595 644			-	-	2 595 644	-	0
Florida	1 764 029			-	-	-	1 764 029	0
Lavalleja	-			-	-	-	-	-
Maldonado	-			-	-	-	-	-
Montevideo	-			-	-	-	-	-
Paysandú	11 180 915			-	-	11 180 915	-	-0
Río Negro	14 982 858			3 453 903	10 390 857	1 138 097	-	-0
Rivera	11 291 037			-	5 697 761	2 486 111	3 107 165	0
Rocha	4 241 771			-	-	2 101 383	2 140 388	0
Salto	1 376 422			-	-	-	1 376 422	-0
San José	5 403 811			-	4 050 805	1 195 573	157 434	-0
Soriano	-			-	-	-	-	-
Tacuarembó	-			-	-	-	-	-
Treinta y Tres	-			-	-	-	-	-
TOTAL	72 106 942	69 197	236 008	5 424 886	26 223 528	28 959 719	11 193 604	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4.5. Pagos Proyecto 999

MANTENIMIENTO CAMINERIA - PROYECTOS 999 PRESUPUESTO 2020 - PAGOS									
DEPARTAMENTO	Acumulado hasta 8° Certificación	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos previstos Octubre	Saldo
Artigas	15 799 138	-	1 501 759	3 125 918	3 531 691	2 687 913	4 951 858	-	0
Canelones	50 624 780	3 593 626	6 506 278	13 520 209	9 347 642	17 657 025	-	-	-0
Cerro Largo	20 886 592	1 499 434	848 028	4 318 538	6 034 797	2 796 645	2 211 862	3 177 288	-0
Colonia	23 333 785	7 205 554	16 128 231	-	-	-	-	-	-
Durazno	19 055 984	-	3 483 390	1 013 220	8 189 345	5 464 581	-	905 448	-0
Flores	12 474 862	-	4 021 362	4 336 984	2 563 145	0	1 553 372	-	-0
Florida	20 163 572	-	3 227 841	2 622 799	8 225 144	2 989 496	2 114 660	983 632	-0
Lavalleja	20 030 873	-	5 322 655	742 032	4 492 768	1 843 569	3 185 119	4 444 728	-0
Maldonado	3 830 956	2 505 317	-	-	-	0	-	1 325 640	-0
Montevideo	9 799 393	-	201 031	568 066	59 616	38 798	279 404	8 652 478	-
Paysandú	26 208 798	1 548 291	-	2 229 144	8 959 257	8 166 834	5 305 271	-	0
Río Negro	17 309 324	2 434 266	5 887 188	8 678 178	309 692	0	-	-	-
Rivera	19 381 990	8 367 671	2 040 893	3 931 417	5 042 009	-	-	-	-
Rocha	19 545 852	1 985 224	3 379 187	5 444 292	2 841 869	1 158 195	4 737 086	-	0
Salto	26 633 331	-	-	-	5 934 316	0	12 234 344	8 464 672	-
San José	19 054 313	5 125 393	4 038 430	2 000 412	7 890 078	0	-	-	-
Soriano	18 840 169	5 333 242	1 507 768	1 142 235	1 196 388	1 893 662	3 513 782	4 253 092	-
Tacuarembó	29 483 644	4 121 134	2 602 821	3 501 350	7 407 201	3 847 153	3 596 532	4 407 453	0
Treinta y Tres	10 799 582	1 992 769	1 730 687	1 185 076	1 264 382	525 005	2 077 597	2 024 067	0
TOTAL	383 256 940	45 711 921	62 427 549	58 359 871	83 289 339	49 068 875	45 760 886	38 638 499	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

5. INFORME PAGOS PREVISTOS PARA EL MES DE OCTUBRE 2020

DEPARTAMENTO	FDI	CAMINERIA 994	CAMINERIA 994	CAMINERIA 998	CAMINERIA 999	FIGM	TOTAL
Artigas	3 825 247		-	-	-	3 026 934	6 852 181
Canelones	26 439 157		959 037	2 648 166	-	32 540 770	62 587 130
Cerro Largo	2 968 247		-	-	3 177 288	6 179 622	12 325 157
Colonia	1 771 006	1 819 506	-	-	-	5 978 906	9 569 418
Durazno	6 151 565		554 755	-	905 448	1 423 212	9 034 980
Flores	1 885 451		-	-	-	1 336 189	3 221 640
Florida	4 428 904		-	1 764 029	983 632	1 565 317	8 741 882
Lavalleja	20 048 267		-	-	4 444 728	1 476 726	25 969 721
Maldonado	11 743 278		4 854 059	-	1 325 640	8 866 140	26 789 117
Montevideo	-		-	-	8 652 478	39 173 583	47 826 061
Paysandú	21 452 780		-	-	-	5 101 605	26 554 385
Río Negro	472 818	201 111	493 673	-	-	2 866 444	4 034 046
Rivera	17 727 995		3 638 762	3 107 165	-	2 931 487	27 405 409
Rocha	3 543 670		1 750 122	2 140 388	-	2 930 549	10 364 729
Salto	12 146 979	585 279	4 830 816	1 376 422	8 464 672	3 861 551	31 265 719
San José	3 887 819		3 068 133	157 434	-	5 270 906	12 384 292
Soriano	1 891 508		-	-	4 253 092	3 270 652	9 415 252
Tacuarembó	8 255 784		5 802 684	-	4 407 453	2 045 576	20 511 497
Treinta y Tres	3 946 516		-	-	2 024 067	1 391 723	7 362 306
TOTAL	152 586 991	2 605 896	25 952 041	11 193 604	38 638 499	131 237 892	362 214 923
	Agosto 8°	Julio 7° y 4°	Agosto 8°	Agosto 8°	Agosto 8°	Octubre	



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Pendientes de tramitar falta documentación incluidos	Proyecto	Desembolso	Monto	Concepto
Colonia	PCRP	7° Julio	1 819 506	Ramal de Ruta 97
Rio Negro	PCRP	7° Julio	201 111	Manafra
Salto	PCRP	4° Abril	585 279	Acceso a Termas del Arapey

(Expresados en pesos uruguayos)
